

Zdůvodnění vynucených víceprací na akci „Výstavba opěrných zdí ve dvoře objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10“

Po vybourání prvního úseku původní opěrné zdi byl za účasti GP, statika a TDS zjištěný stav a byl odsouhlasen nový postup spočívající v rozdělení jednotlivých záběrů i na výšku, byla upravena svíslá výtzuž zhuštěním a s přesahy.

Za opěrnou zdí bude odbourána vrstva pro uložení drenáže a ta bude provedena dvouúrovňově.


Za patou opěrné zdi bude vyplněn prostor betonovou směsí.

V průběhu prací bylo provedeno přetřídění zeminy dle skutečné tvrdosti zeminy – horniny a upraven poměr ručního a strojního těžení horniny.

U sousední žebet stěny byla pod terénem nalezena betonová konstrukce, která je nutná odbourat a povrchově upravit.

Nerealizované práce: kačírek na vodorovné straně spodní opěrné stěny, asfaltový beton, bankovní záruky, jílová ucpávka, parkový obrubník



Zhotovitel: Vinohradská stavební s.r.o.



VINOHRADSKÁ stavební, s.r.o.
Silurské 1175/8
152 00 Praha 5
IČ: 654 16 228
DIČ: CZ65416228

TDS: Tomáš Lubovský

GP: PLÁN PLUS s.r.o.



PLÁN PLUS, s.r.o.
Hornátecká 19
182 00 Praha 8
Tel./Fax: 283 841 569
DIČ: CZ62917544

Zdůvodnění vynucených víceprací na akci „Výstavba opěrných zdí ve dvoře objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10“

Po vybourání prvního úseku původní opěrné zdi byl za účasti GP , statika a TDS zjištěný stav a byl odsouhlasen nový postup spočívající v rozdělení jednotlivých záběrů i na výšku , byla upravena svislá výztuž zhuštěním a s přesahy.

Za opěrnou zdí bude odbourána vrstva pro uložení drenáže a ta bude provedena dvouúrovňově.

Za patou opěrné zdi bude vyplněn prostor betonovou směsí.

V průběhu prací bylo provedeno přetřídění zeminy dle skutečné tvrdosti zeminy – horniny a upraven poměr ručního a strojního těžení horniny.


U sousední želbet stěny byla pod terénem nalezena betonová konstrukce, která je nutná odbourat a povrchově upravit.

Nerealizované práce: kačírek na vodorovné straně spodní opěrné stěny, asfaltový beton, bankovní záruky, jílová ucpávka , parkový obrubník

Zhotovitel: Vinohradská stavební s.r.o

VINOHRADSKÁ stavební, s.r.o.
Silurská 1175/8
152 00 Praha 5
IČ: 654 15 228
DIČ: CZ65416228

TDS: Tomáš Lubovský

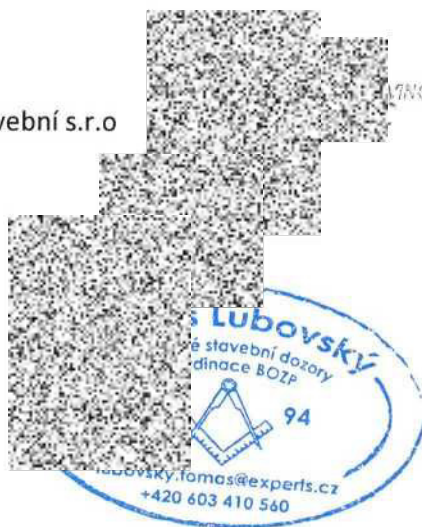

GP: PLÁN PLUS s.r.o
